


du 04.11.24 au 08.11.24

- Ancrages haut


- Ancrages haut

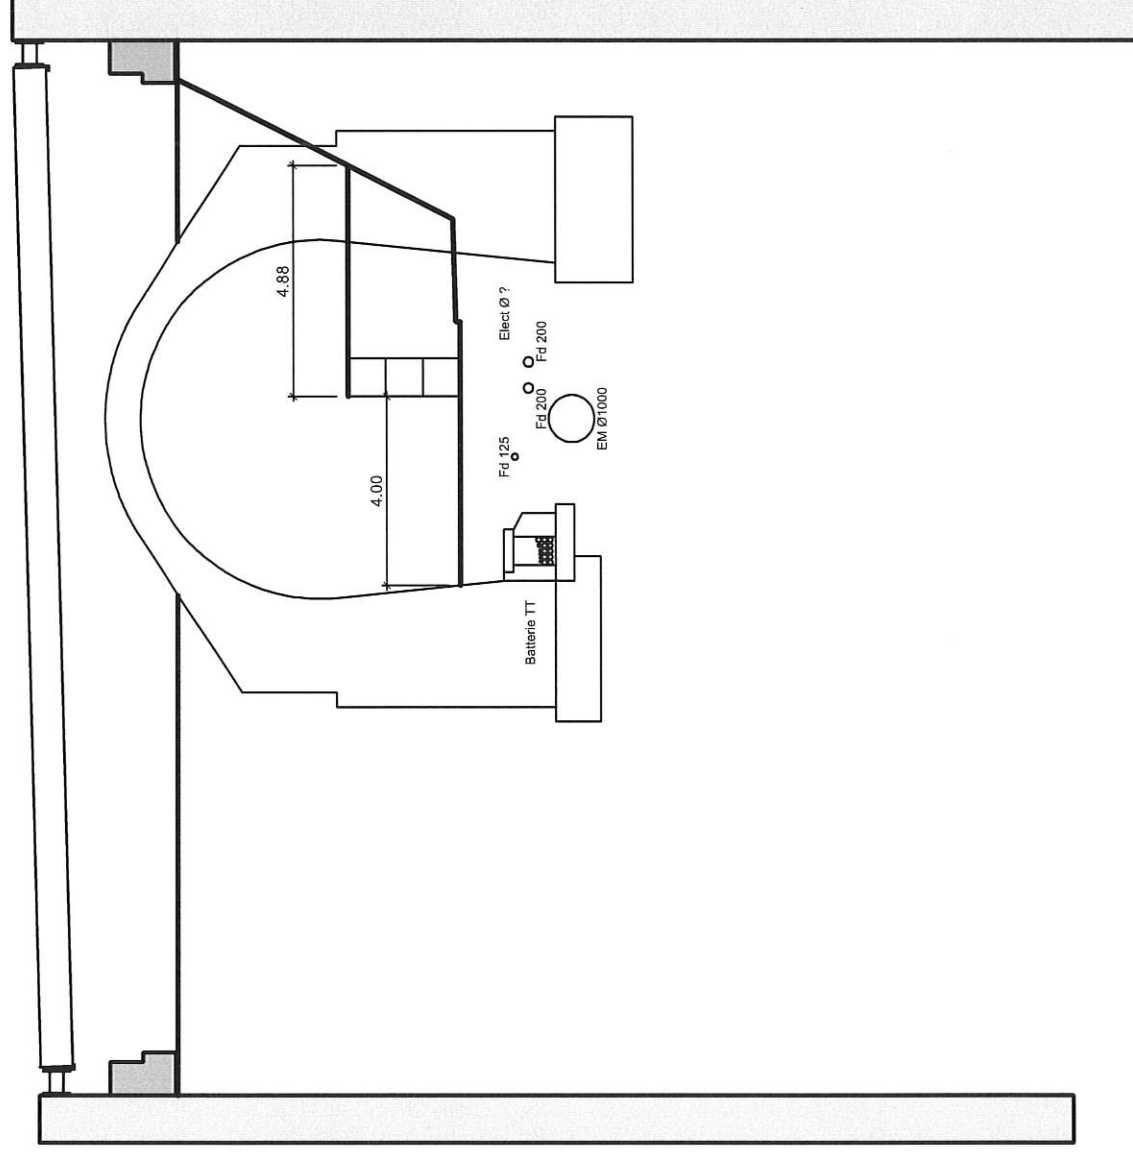

du 09.11.24 au 22.11.24


- Terrassement CDF
- Lobgrines 1 et 2 CDF

- Longrine 1 Bienne

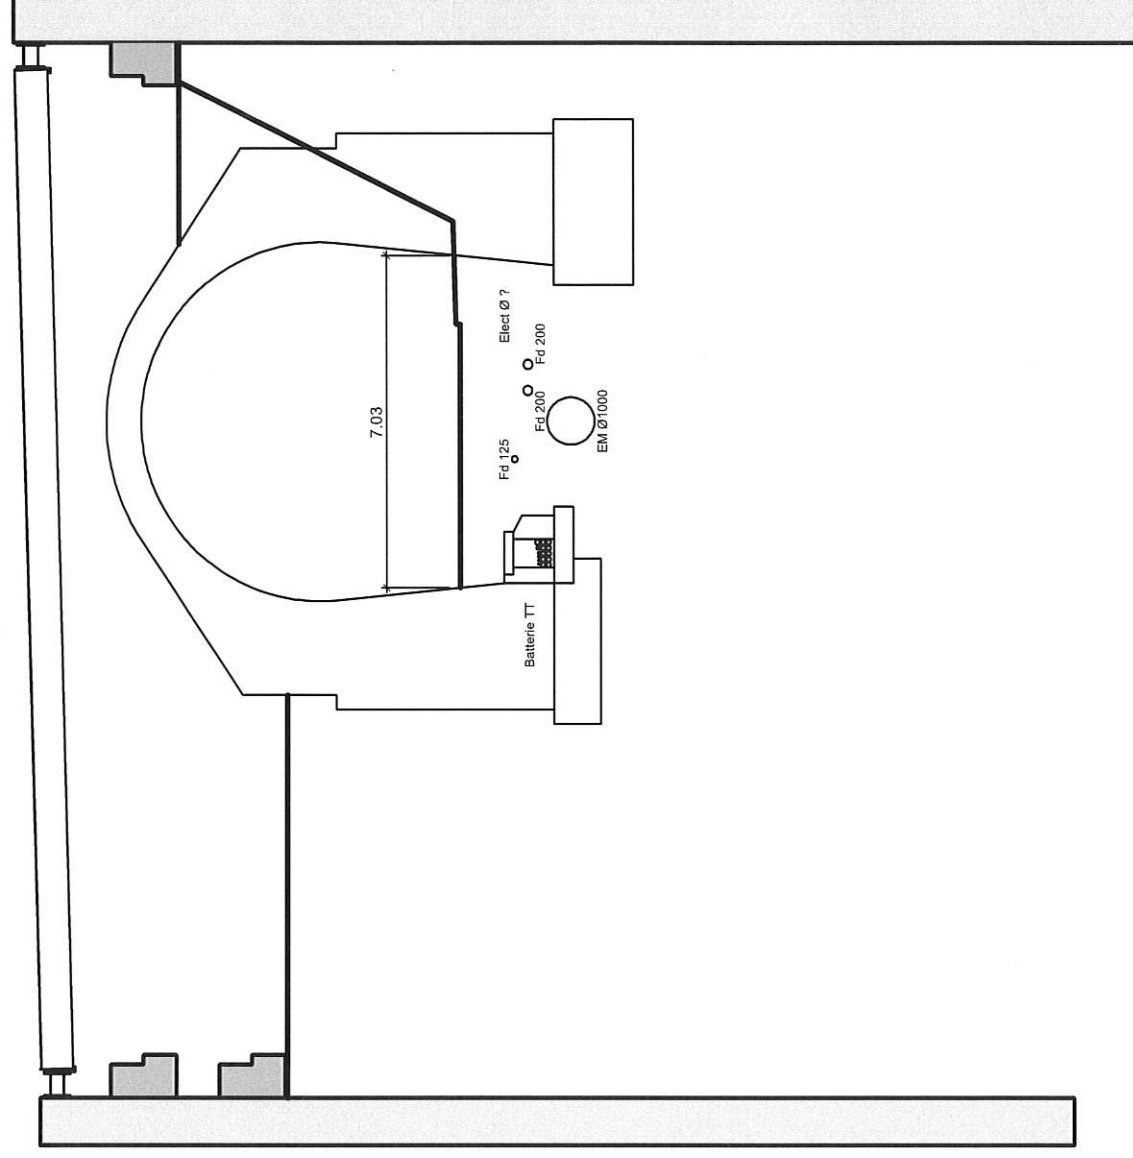


du 23.11.24 au 24.11.24 OCP

-Démolition

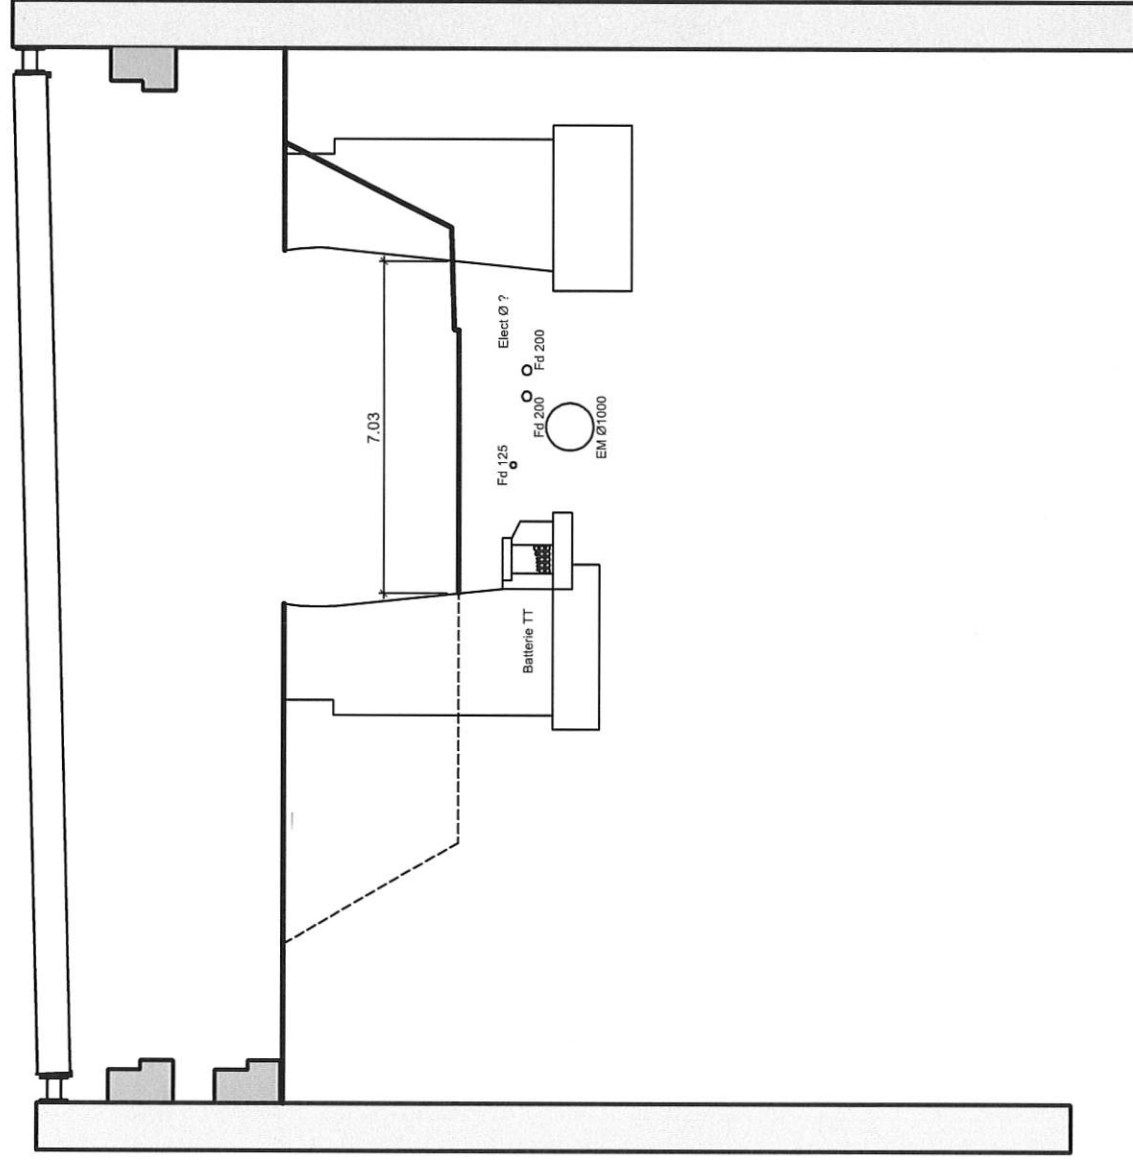

du 25.11.24 au 06.12.24


- Terrassement CDF      -Butonnage      - Longrine 2 Bienne

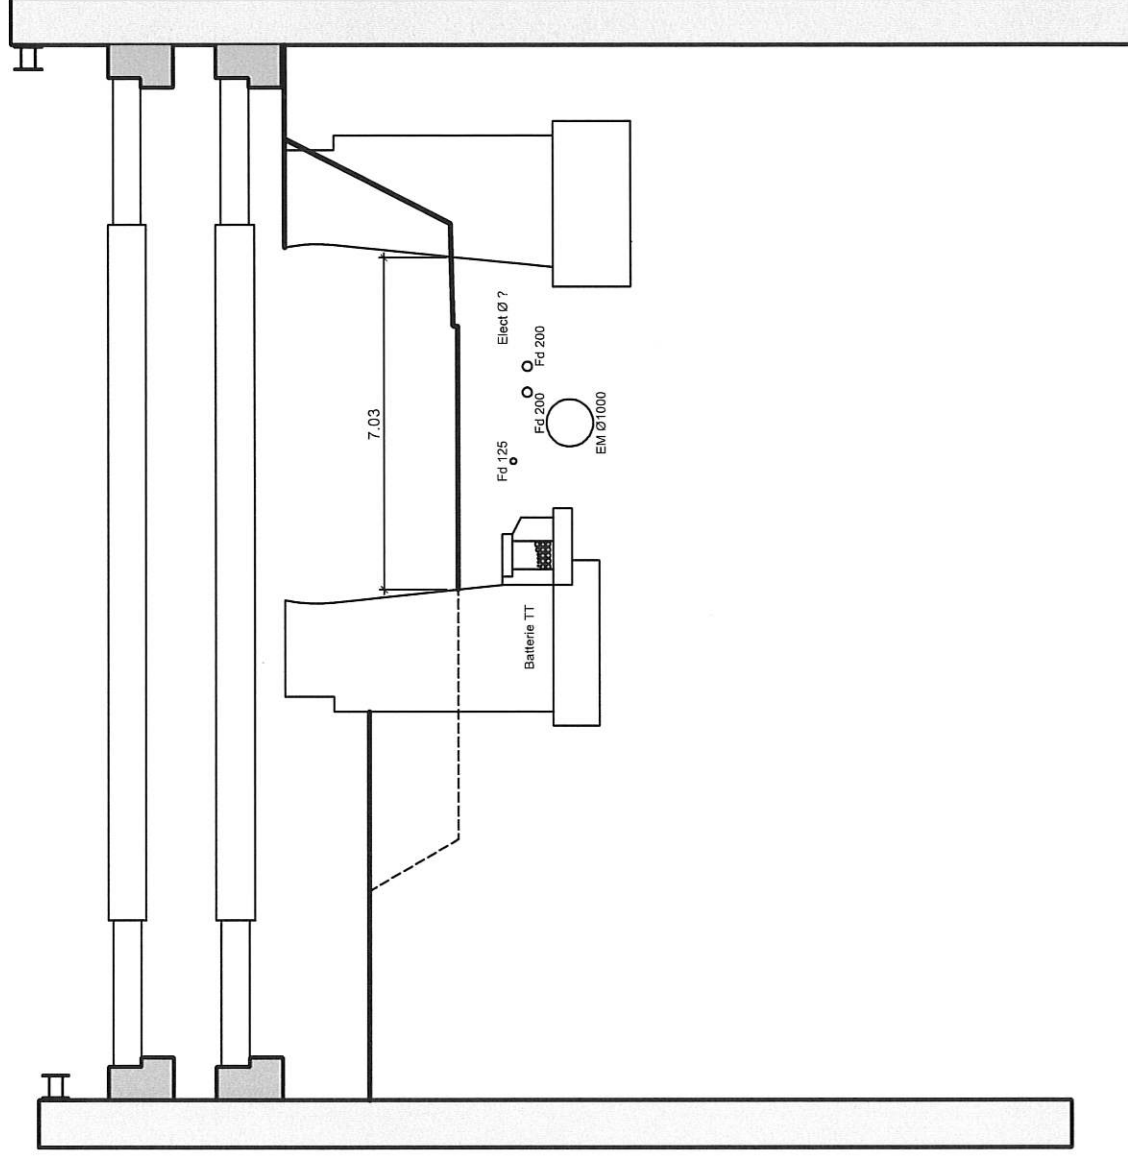

du 09.12.24 au 17.01.25

- Fin terrassement CDF


- Démolition ouvrage Bienne

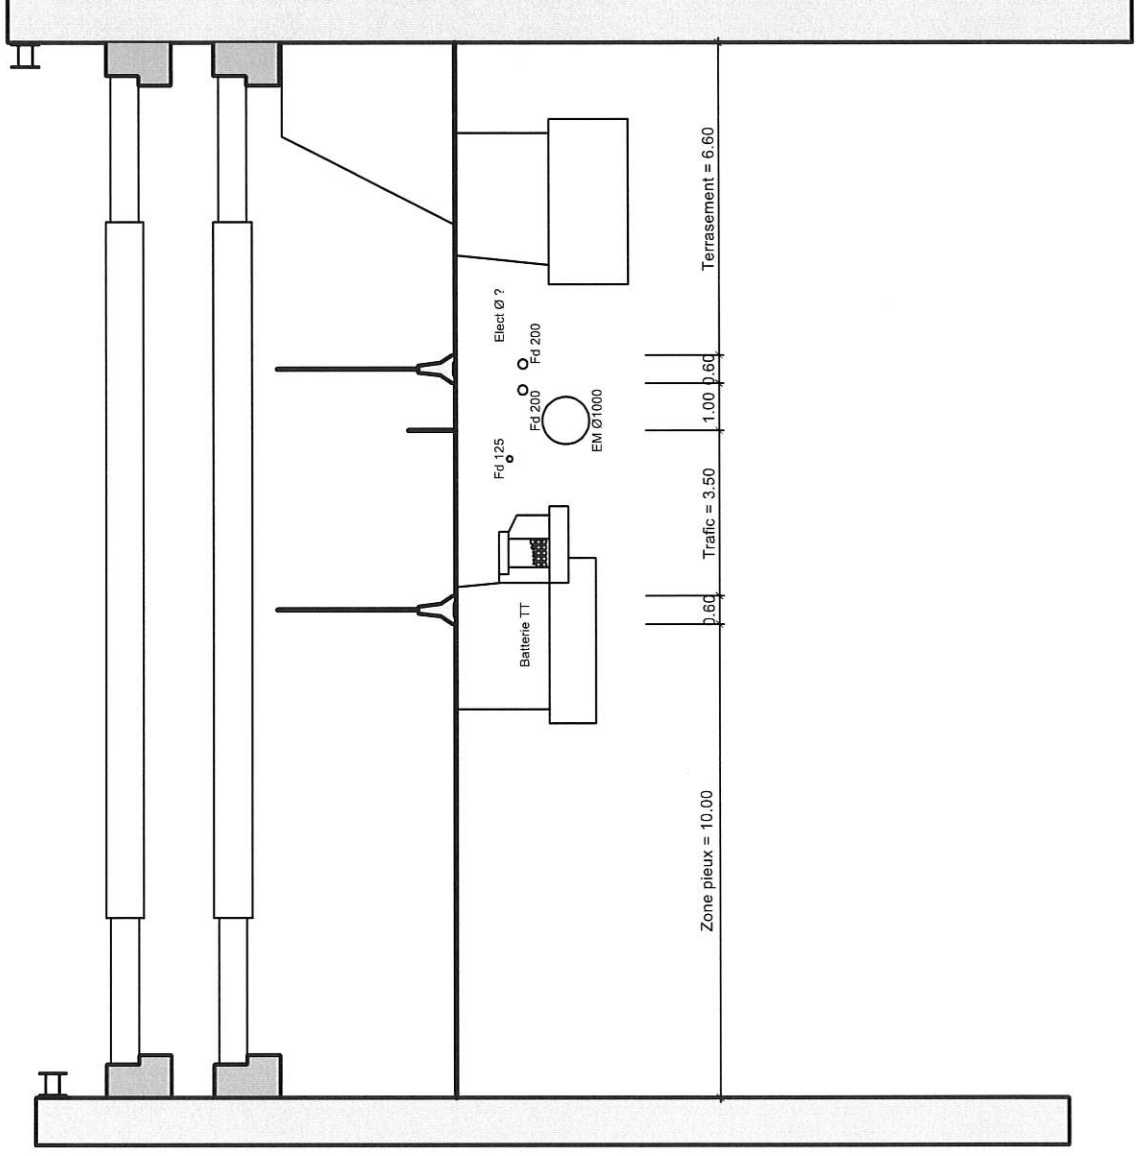

du 20.01.25 au 07.02.25

- Pieux


- Excavation Bienne

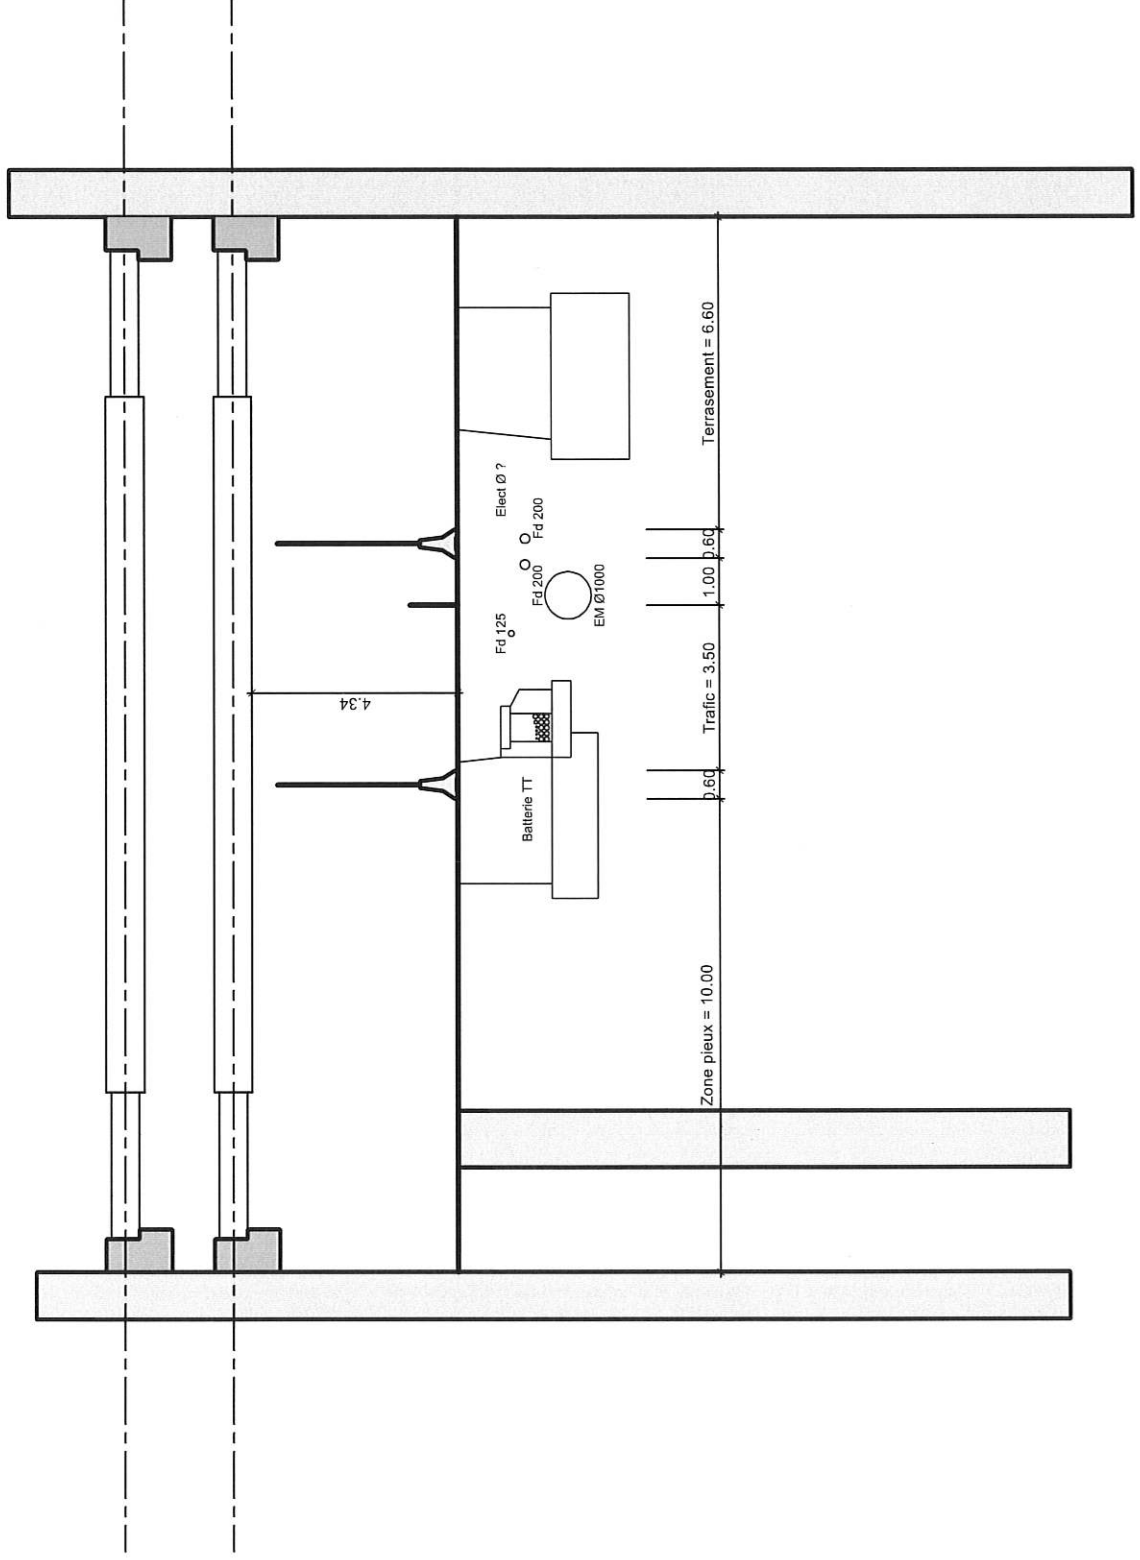

du 10.02.25 au 07.03.25


- Solde excavation CDF
- Démolition anciennes fondations
- Dégagement Swisscom
- Fouilles en tranchée pour boutons béton

- Trafic

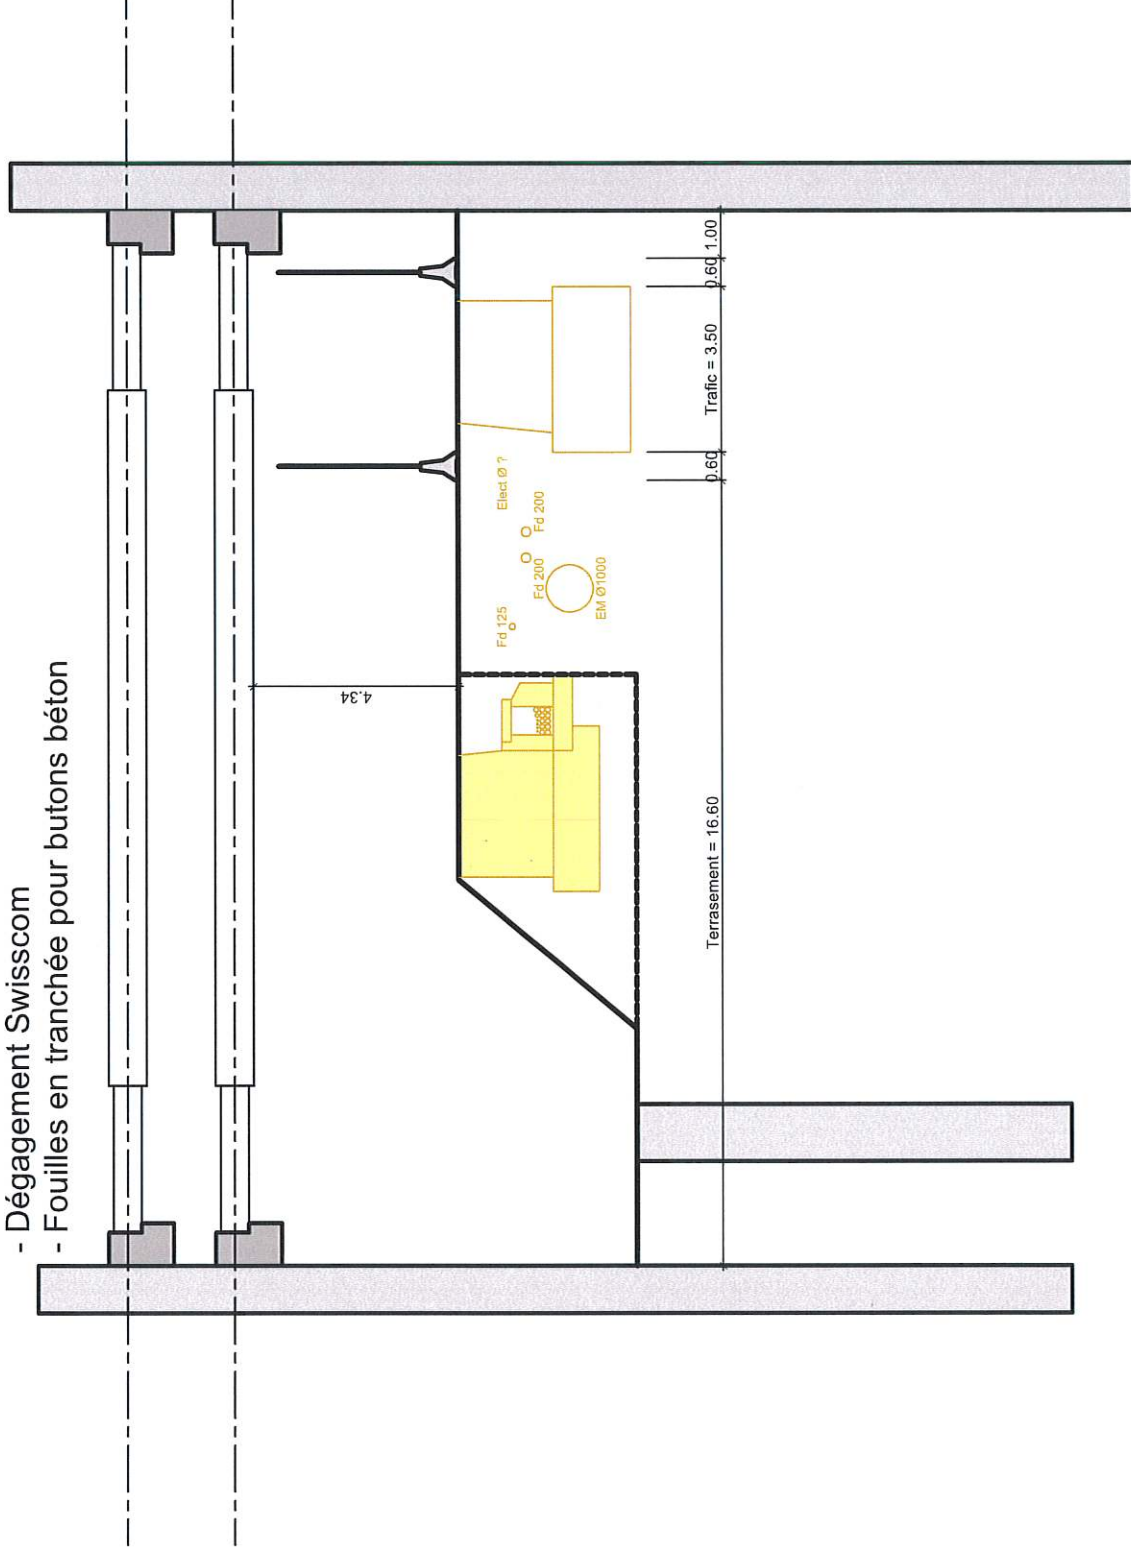

du 10.03.25 au 25.04.25


- Fondation et butons béton CDF
- Etape 1 mur
- Collecteurs et remblayage
- Trafic

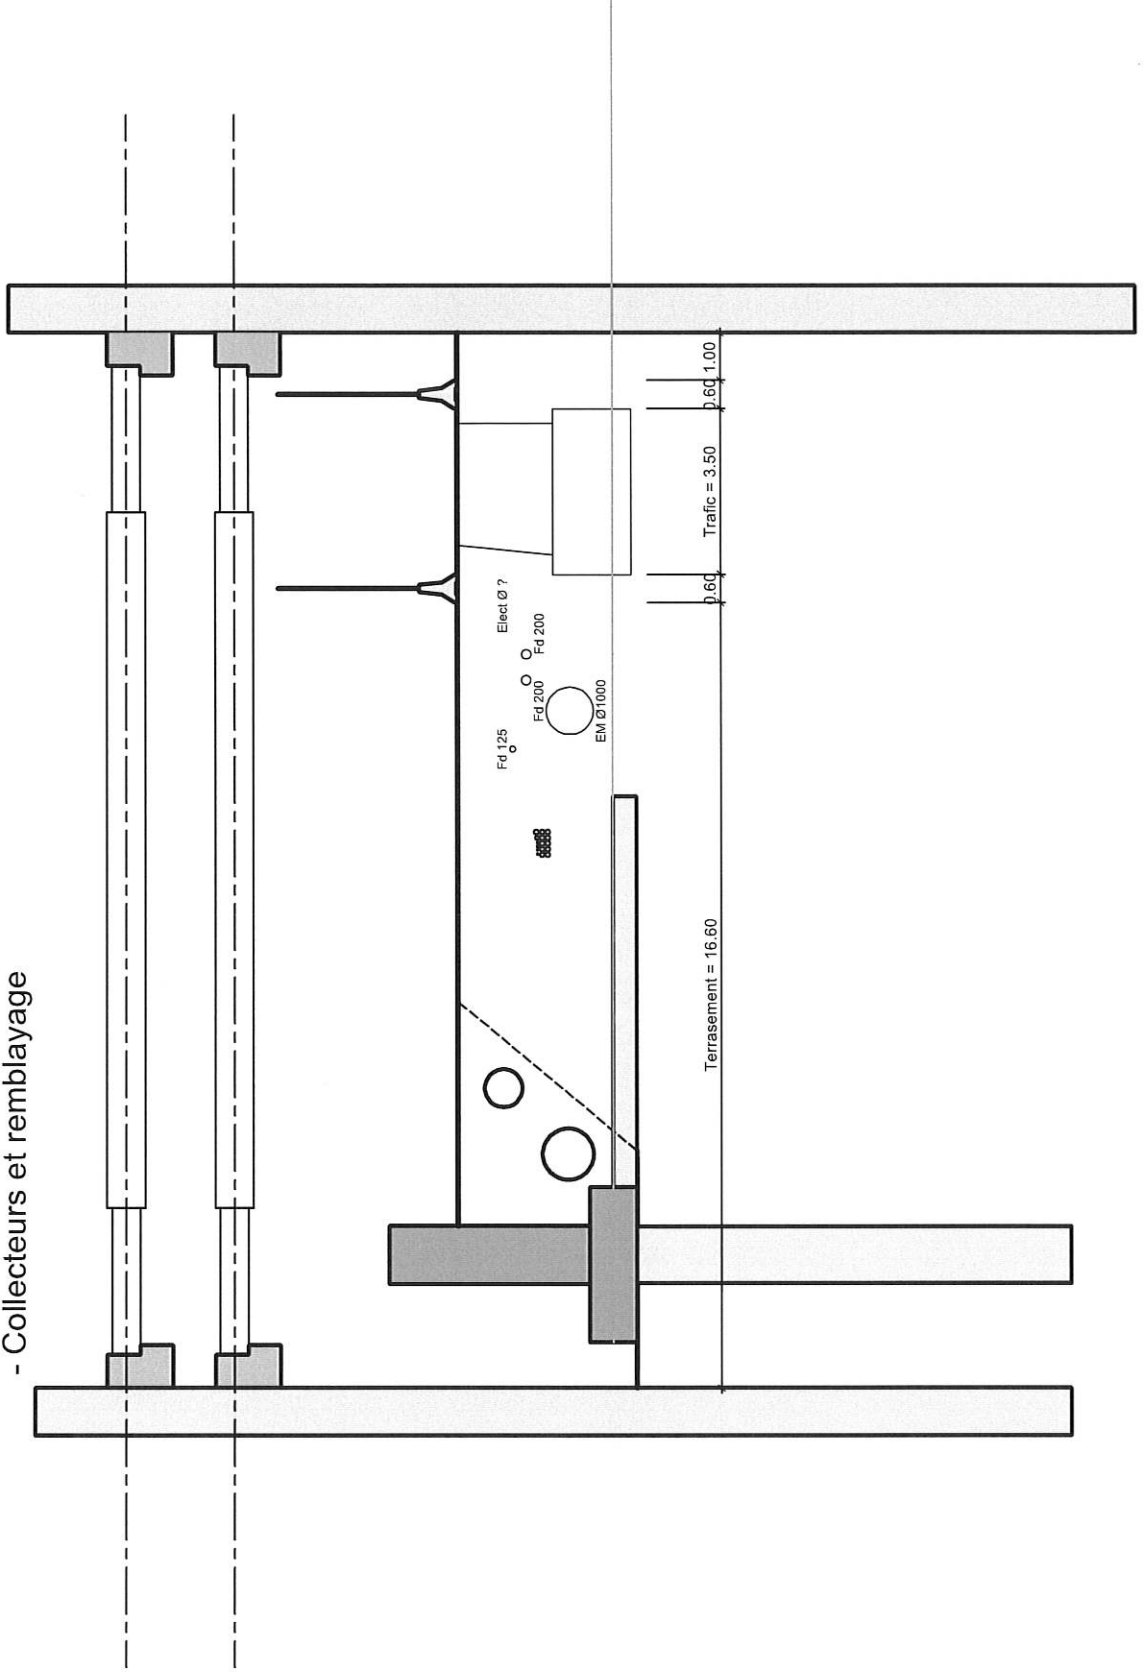

du 28.04.25 au 13.06.25

- Etape 2 mur

- Pieux
- Solde excavation
- Démolition ancienne fondation

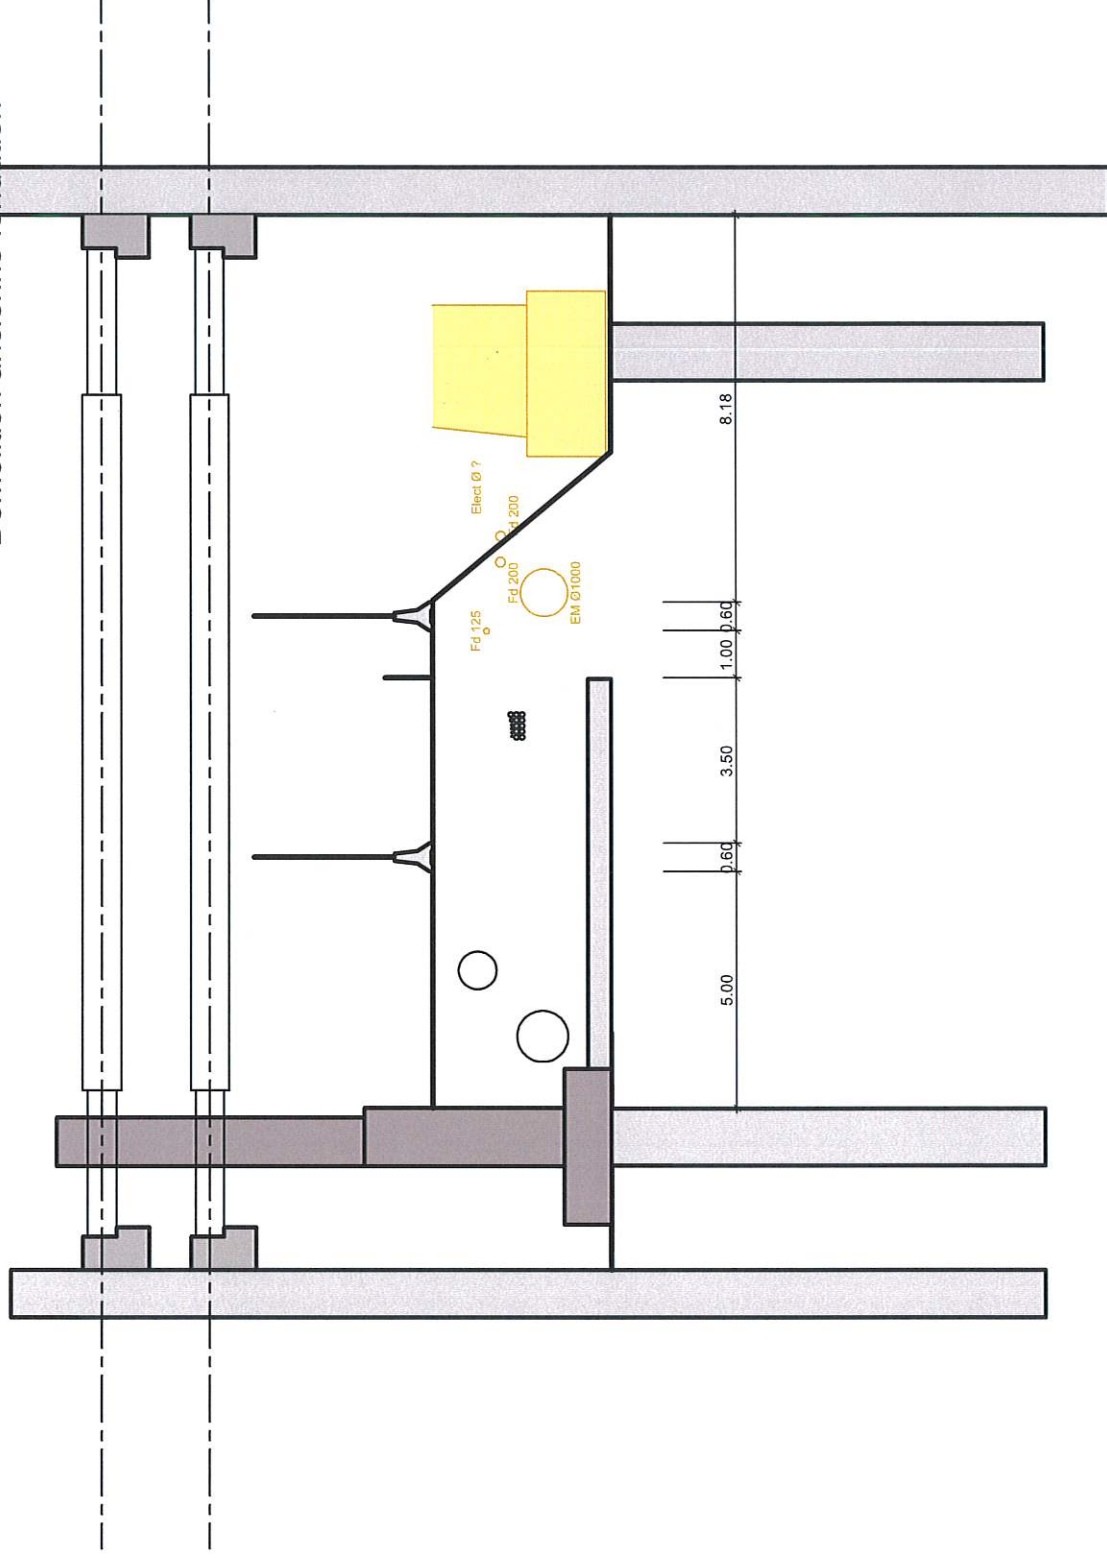

du 16.06.25 au 01.08.25

- Fondations
- Mur Bienne

